



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE NICOLÁS ROMERO



TESORERÍA MUNICIPAL
Sub Tesorería de Egresos

Número de oficio: **TM/224/2019**
Asunto: **Informe SIAVAMEN**

Nicolás Romero, Estado de México, a 14 de Febrero del 2019

MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO
DIRECTORA GENERAL DE INVERSIÓN
P R E S E N T E

AT'N
LIC. ADRIAN TRINIDAD ARIAS
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
P R E S E N T E

Por medio del presente remito a usted el Informe Mensual del Ramo 33 correspondiente al mes de enero 2019, del ejercicio, FISM 2016, FISM 2018 y FAFM 2018. Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL



M. EN C. LUIS DAVID VELASQUEZ GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL



ING. DARIO MATA MATA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C.c.p. Archivo



JUNTOS
ARMANDO
EL CAMBIO




REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018. AVANCE AL MES DE ENERO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 261,312,429.11 REINTEGRO: \$ 1,501,304.03

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Objeto/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17337/0001	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	ALUMBRADO PUBLICO / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2018-02-21	2018-12-31	2018-02-21	2018-12-31	32,664,872.29	32,664,872.29	0.00	32,664,872.29	32,664,872.29	0.00	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIOS	1	1	1	100	100.00
17353/0002	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PASIVO A LARGO PLAZO CREDITOS / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2018-02-21	2018-12-31	2018-02-21	2018-12-31	14,587,363.96	14,587,363.96	0.00	14,587,363.96	14,587,363.96	0.00	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIOS	1	1	1	100	100.00
17355/0003	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PASIVO A LARGO PLAZO INTERESES / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2018-02-21	2018-12-31	2018-02-21	2018-12-31	17,118,649.53	17,118,649.53	0.00	17,118,649.53	17,118,649.53	0.00	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIOS	1	1	1	100	100.00
17357/0004	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	ADEUDOS ANTERIORES CONVENIO ISSEMYM / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2018-02-21	2018-12-31	2018-02-21	2018-12-31	5,569,029.00	5,569,029.00	0.00	5,569,029.00	5,569,029.00	0.00	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIOS	1	1	1	100	100.00
17358/0005	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	APORTACIONES ISSEMYM / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2018-02-21	2018-12-31	2018-02-21	2018-12-31	44,047,984.55	44,047,984.55	0.00	44,047,984.55	44,047,984.55	0.00	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIOS	1	1	1	100	100.00
17360/0006	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	DESCUENTO DE AGUA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2018-02-21	2018-12-31	2018-02-21	2018-12-31	64,386,093.49	64,386,093.49	0.00	64,386,093.49	64,386,093.49	0.00	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIOS	1	1	1	100	100.00
17362/0007	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE COBRANZA ALUMBRADO PUBLICO / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2018-02-21	2018-12-31	2018-02-21	2018-12-31	394,161.93	394,161.93	0.00	394,161.93	394,161.93	0.00	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIOS	1	1	1	62	100.00
17364/0008	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2018-02-21	2018-12-31	2018-02-21	2018-12-31	22,215,127.49	22,215,127.49	0.00	22,215,127.49	22,215,127.49	0.00	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIOS	1	1	1	100	100.00
17367/0009	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2018-02-21	2018-12-31	2018-02-21	2018-12-31	38,921,372.10	38,921,372.10	0.00	38,921,372.10	38,921,372.10	0.00	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIOS	1	1	390	97	100.00
17368/0010	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2018-02-21	2018-12-31	2018-02-21	2018-12-31	2,658,167.20	2,658,167.20	0.00	2,658,167.20	2,658,167.20	0.00	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIOS	1	1	390	100	100.00
17372/0011	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	SEGUROS DE VIDA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2018-02-21	2018-12-31	2018-02-21	2018-12-31	680,735.00	680,735.00	0.00	680,735.00	680,735.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIOS	1	1	390	100	100.00
17375/0012	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2018-02-21	2018-12-31	2018-02-21	2018-12-31	9,362,316.11	9,362,316.11	0.00	9,362,316.11	9,362,316.11	0.00	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIOS	1	1	400,000	95	100.00
17384/0017	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2018-02-21	2018-12-31	2018-02-21	2018-12-31	6,287,107.72	6,287,107.72	0.00	6,287,107.72	6,287,107.72	0.00	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIOS	1	1	80	95	100.00





REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE ENERO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00


Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obral/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
										Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
3142/ 0001 220821	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ETAPA/COL. JUAZTEPEC, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REENCARPETADO ASFALTICO, AGUA CALIENTE 1RA ETAPA/COL. JUAZTEPEC, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31		903,175.71	902,866.85	902,866.85	0.00	02 METRO CUADRO	2 COLONIA	1	1,500	100	99.94
3143/ 0002 220826	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ETAPA/COL. JUAZTEPEC, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REENCARPETADO ASFALTICO, AGUA CALIENTE 2DA ETAPA, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31		996,824.29	996,264.07	996,264.07	0.00	02 METRO CUADRO	2 COLONIA	1	1,200	100	99.94
3165/ 0003 128826	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA ENRIQUEZ / EL TRAFICO	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31		810,000.00	785,161.01	785,161.01	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	473	97	96.93
3167/ 0004 220766	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESC. HEROES DE CHAPULTEPEC, SAN JUAN TLIHUACA / SAN JUAN TLIHUACA	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31		890,000.00	813,824.60	813,824.60	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	720	92	91.45
3173/ 0005 130523	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ / BENITO JUAREZ BARRON 1a. SECC.	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,080	100	100.00
3175/ 0006 132416	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 165 ACOLMIZTLI NEZAHUALCOYOTL, BENITO JUAREZ BARRON 2DA SECCION / BENITO JUAREZ BARRON 2a. SECC.	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31		710,000.00	706,751.17	706,751.17	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	650	99	99.54
3176/ 0007 130731	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN EL JARDIN DE NIÑOS YAOCALLI / INDEPENDENCIA 1* SECCION	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31		820,000.00	810,071.72	810,071.72	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	250	100	98.78
3178/ 0008 130794	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUANA DE ASBAJE / GAVILLERO, EL	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31		850,000.00	729,948.32	729,948.32	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,200	86	85.87
3179/ 0009 130847	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COLONIA EL TRAFICO / EL TRAFICO	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31		820,000.00	723,719.83	723,719.83	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,200	88	88.25
3180/ 0010 130877	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 27, COLONIA 5TO. BARRIO CAHUACAN / EJIDO CAHUACAN	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31		1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,200	100	100.00





TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obralocalidad	Mod. Ejec.	Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ter. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Apr. Real	U. Medida	Cantidad
3181/0011/130909	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 3RO. COL SANTA MARIA MAGDALENA CAHUACAN / SANTA MARIA MAGDALENA CAHUACAN	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	07 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,200	100	100.00
3182/0012/130944	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO / COLONIA LLANO GRANDE (NUEVO EJIDO)	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	653,175.71	653,175.71	0.00	548,964.77	0.00	07 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,000	83	84.04
3744/0013/130966	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION LOMA DE SAN JOSE 1A ETAPA, MORELOS / COLONIA MORELOS	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,998,116.45	0.00	07 METRO CUADRO	2 COLONIA	1	1,200	100	99.96
4524/0014/150601	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE LAPTOS / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	50 EQUIPO	4 MUNICIPIO	40	25,000	100	100.00
4526/0015/150602	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE UPS/ REGULADOR FORZA/ VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	50 EQUIPO	4 MUNICIPIO	20	25,000	100	100.00






GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE ENERO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00


Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obral/Localidad	Mod. Ejec.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprobada	Real	U. Medida	Cantidad
4529/ 0016 150603	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE IMPRESORA EPSON L-310 / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	50 EQUIPO	20.00	4 MUNICIPIO	20	25,000	100	100.00
4531/ 0017 150604	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE IMPRESORA PORTÁTIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	14,468.00	14,468.00	0.00	14,468.00	0.00	50 EQUIPO	3.00	4 MUNICIPIO	3	25,000	100	100.00
4532/ 0018 150605	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE DIGITALIZADOR HP / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	50 EQUIPO	3.00	4 MUNICIPIO	3	25,000	100	100.00
4533/ 0019 150606	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS SILLA TUBULAR / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,000.00	4 MUNICIPIO	1,000	25,000	100	100.00





TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Fec. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
										Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
4537/0021/150607	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PIZARRON BLANCO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31		22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	40.00		4	MUNICIPIO	25,000	100	100.00
4537/0022/150609	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS MESA PLEGABLE / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31		60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	40.00		4	MUNICIPIO	25,000	100	100.00
4537/0023/150610	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS LOCKER / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31		50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	20.00		4	MUNICIPIO	25,000	100	100.00
4537/0023/150610	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, ESTANTE TIPO ESQUELETO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31		41,250.00	41,250.00	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	01 METRO LINEAL	25.00		4	MUNICIPIO	25,000	100	100.00





Control	Sector	Programa	SubPrograma	Ingreso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
4538/0024150611	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, MODULO OPERATIVO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-08-08	2016-12-31	79,999.99	79,999.99	0.00	79,999.99	79,999.99	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2.00		4 MUNICIPIO	2	25,000	100	100.00
6845/00252507	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE MARIANO MATAMOROS / LOMA DE SAN JOSE	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	302,177.72	302,177.72	0.00	301,950.34	301,950.34	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		2 COLONIA	1	800	100	99.92
6846/002525725	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CUBIERTA EN PATIO ESCOLAR PARA PREESCOLAR TLAZOPILLI / CAJA DE AGUA	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	243,797.00	243,797.00	0.00	243,345.54	243,345.54	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	700.00		5 ALUMNO	1	300	100	99.81
6847/0027260552	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO ESCOLAR PRIM. LAZARO CARDENAS / SAN JOSE LOS BARBECHOS (LOS BARBECHOS)	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	243,797.00	243,797.00	0.00	243,125.18	243,125.18	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	150.00		5 ALUMNO	1	350	100	99.73
6848/0028260552	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, SEC. SEC. ESTIC. COLMENA	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	650,000.00	650,000.00	0.00	649,552.12	649,552.12	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	48.00		5 ALUMNO	1	200	100	99.93
6849/0029270891	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, SEC. SEC. CARLOS MONSIVAIS / VEINTIDOS DE FEBRERO	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	700,000.00	0.00	699,668.47	699,668.47	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	48.00		5 ALUMNO	1	250	100	99.95
6850/0030271155	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESC. TELESECUNDARIA MANUEL ESQUIVEL DURAN / EJIDO CAHUACAN	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	700,000.00	0.00	699,739.34	699,739.34	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	48.00		5 ALUMNO	1	300	100	99.96
6851/0031271431	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESC. PRIM. MAGISTERIO NACIONAL / SAN ISIDRO LA PAZ 3ª SECCION	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,299,502.60	1,299,502.60	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	48.00		5 ALUMNO	1	300	100	99.96
6852/0032271513	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA HERMENEGILDO GALEANA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,399,414.54	2,399,414.54	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	10,000.00		2 COLONIA	1	680	100	99.98
6853/0033272019	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, SEC. SEC. JOSE MARTI / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	1,361,580.00	1,361,580.00	0.00	1,246,924.85	1,246,924.85	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	48.00		5 ALUMNO	1	300	91	91.58
6854/0034272213	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	204 PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA / BENITO JUAREZ BARRON 1ª. SECC.	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	700,000.00	0.00	697,294.71	697,294.71	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	48.00		5 ALUMNO	1	150	100	99.61



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. AVANCE AL MES DE ENERO 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 70,170,837.00 REINTEGRO: \$ 820,933.93

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Obrar/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Intereses B.	Total	R. del Fondo.	Inversión Ejercida	Intereses B.	Mielas Totales		Beneficiarios		Avances			
				Inciso	Objetivo					Total	R. del Fondo.						Aprobada	Real	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Personas	Fis.
22400/0014/213251	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	264 PUENTES	REHABILITACION (REMODELACION) DE PUENTE PEATONAL EN VIA PRIMARIA CALLE ZACATECAS, SAN ILDEFONSO / SAN ILDEFONSO CENTRO	CONTRATO	2018-05-17	2018-12-31	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	02	METRO CUADRO	3	POBLADO	1	3,000	100	100.00
22401/0015/213263	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA, ESCUELA FORD 204, ZARAGOZA / ZARAGOZA 1ª SECCION	CONTRATO	2018-05-17	2018-12-31	598,610.00	598,610.00	0.00	598,610.00	598,610.00	0.00	598,610.00	0.00	02	METRO CUADRO	5	ALUMNO	1	650	100	100.00
23184/0016/255785	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	174 COMEDORES COMUNITARIOS	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, LAGO DE TEXCOCO FRACC. CUMBRES DEL SOL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2018-02-21	2018-12-31	1,398,866.28	1,398,866.28	0.00	1,398,866.28	1,398,866.28	0.00	1,398,866.28	0.00	02	METRO CUADRO	1	PERSONA	1	1,500	100	100.00
23185/0017/285559	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	TECHADO EN AREAS DE PARTICIPACION FISICA, ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ / FRACCIONAMIENTO DE LOS MANANTIALES	CONTRATO	2018-02-21	2018-12-31	745,698.18	745,698.18	0.00	745,698.18	745,698.18	0.00	745,698.18	0.00	02	METRO CUADRO	5	ALUMNO	1	600	100	100.00
23187/0019/291684	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	Y SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS OTROS SERVICIOS	246 SERVICIOS PROFESIONALES, OFICIALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	SERVICIOS TECNICOS GEOGRAFICOS, VARIAS CALLES, SAN JUAN TLUHUACA / SAN JUAN TLUHUACA	CONTRATO	2018-05-17	2018-12-31	496,010.66	496,010.66	0.00	496,010.66	496,010.66	0.00	496,010.66	0.00	20	ESTUDIO	4	MUNICIPIO	1	300	100	100.00
23188/0020/285674	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	174 COMEDORES COMUNITARIOS	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2018-05-17	2018-12-31	496,010.66	496,010.66	0.00	496,010.66	496,010.66	0.00	496,010.66	0.00	02	METRO CUADRO	3	POBLADO	1	750	100	100.00
23189/0021/285641	15 AYS	AF AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	RED DE AGUA, CALLE MANANTIALES, CAJA DE AGUA / CAJA DE AGUA	CONTRATO	2018-05-17	2018-12-31	346,977.52	346,977.52	0.00	346,977.52	346,977.52	0.00	346,977.52	0.00	01	METRO LINEAL	2	COLONIA	1	350	100	100.00
23190/0022/302193	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	286 DRENAJE SANITARIO	DRENAJE CERRADA GUADALUPE, SAN MIGUEL HILA / SAN MIGUEL HILA	CONTRATO	2018-05-17	2018-12-31	499,488.12	499,488.12	0.00	499,488.12	499,488.12	0.00	499,488.12	0.00	01	METRO LINEAL	2	COLONIA	1	480	100	100.00
23191/0023/301973	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	DRENAJE CALLE ARBOLADA, SAN MIGUEL HILA / SAN MIGUEL HILA	CONTRATO	2018-05-17	2018-12-31	749,705.83	749,705.83	0.00	749,705.83	749,705.83	0.00	749,705.83	0.00	01	METRO LINEAL	2	COLONIA	1	620	100	100.00
23192/0024/301679	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	DRENAJE CERRADA DEL RIO, HIDALGO ZDA SECCION / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2018-05-17	2018-12-31	95,443.30	95,443.30	0.00	95,443.30	95,443.30	0.00	95,443.30	0.00	01	METRO LINEAL	2	COLONIA	1	190	100	100.00
23193/0025/292037	18 VV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION CALLE LA CRUZ, AMPLIACION LIBERTAD / LIBERTAD 1ª SECCION	CONTRATO	2018-05-17	2018-12-31	2,765,132.55	2,765,132.55	0.00	2,765,132.55	2,765,132.55	0.00	2,765,132.55	0.00	01	METRO LINEAL	2	COLONIA	1	980	100	100.00
23194/0026/285599	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	286 DRENAJE SANITARIO	DRENAJE IRA ETAPA AMPLIACION MORELOS / COLONIA MORELOS	CONTRATO	2018-05-17	2018-12-31	529,702.31	529,702.31	0.00	529,702.31	529,702.31	0.00	529,702.31	0.00	01	METRO LINEAL	2	COLONIA	1	540	100	100.00
23195/0027/256346	15 AYS	AF AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, VARIAS CALLES LIBERTAD / AZOTLAN PARTE ALTA LIBERTAD 1ª SECCION	CONTRATO	2018-05-17	2018-12-31	2,499,450.81	2,499,450.81	0.00	2,499,450.81	2,499,450.81	0.00	2,499,450.81	0.00	01	METRO LINEAL	2	COLONIA	1	490	100	100.00

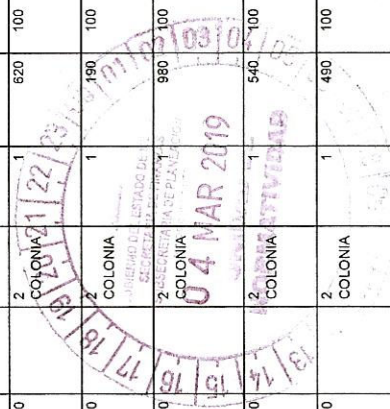



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. AVANCE AL MES DE ENERO 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 70,170,837.00 REINTEGRO: \$ 820,933.93

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Programa	Inciso	Obrat/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecida		Medias Totales		Beneficiarios		Avances		
										Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Real	U. Medida
23198/0028/301438	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA DIGNA, VARIAS CALLES Y COLONIAS / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2018-05-17	2018-12-31	2,698,545.11	2,698,545.11	0.00	2,698,545.11	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	2,000.00	3 POBLADO	1	550	100.00
23197/0029/301323	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION DIRECTA	174 COMEDORES COMUNITARIOS	AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO / COLONIA FLORES MAGON	CONTRATO	2018-05-17	2018-12-31	399,628.21	399,628.21	0.00	399,628.21	0.00	96.00	02 METRO CUADRO	96.00	3 POBLADO	1	800	100.00
23198/0030/300604	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	259 LINEAS DE CONDUCCION	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CALLE ACAPULCO, JUAREZ CENTRO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2018-05-17	2018-12-31	2,793,185.62	2,793,185.62	0.00	2,793,185.62	0.00	1,800.00	01 METRO LINEAL	1,800.00	2 COLONIA	1	690	100.00
23198/0031/300474	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2018-05-17	2018-12-31	9,674,044.71	9,674,044.71	0.00	9,674,044.71	0.00	9,000.00	65 KILOMETRO CUADRADO	9,000.00	4 MUNICIPIO	1	7,200	100.00
25064/0032/302369	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, PROLONGACION ACAPULCO, VISTA HERMOSA / VISTA HERMOSA	CONTRATO	2018-10-25	2018-12-31	2,957,595.99	2,957,595.99	0.00	2,957,595.99	0.00	20.00	03 METRO CUBICO	20.00	2 COLONIA	1	750	100.00
25065/0033/302999	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE, REHABILITACION DE TANQUE, LOMA DEL RIO / LOMA DEL RIO	CONTRATO	2018-10-25	2018-12-31	629,519.70	629,519.70	0.00	629,519.70	0.00	15.00	03 METRO CUBICO	15.00	2 COLONIA	1	150	100.00
25066/0034/302708	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, VARIAS CALLES, LA INDEPENDENCIA 1RA SECCION / INDEPENDENCIA 1* SECCION	CONTRATO	2018-10-25	2018-12-31	998,175.16	998,175.16	0.00	998,175.16	0.00	150.00	01 METRO LINEAL	150.00	2 COLONIA	1	320	100.00
25067/0035/401712	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA SERVICIO DE DESALJO DE AGUAS RESIDUALES, INTRODUCCION DE DRENAJE / SANTA ANITA	CONTRATO	2018-10-25	2018-12-31	840,553.95	840,553.95	0.00	840,553.95	0.00	18.00	01 METRO LINEAL	18.00	2 COLONIA	1	350	100.00
25068/0036/402233	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	174 COMEDORES COMUNITARIOS	INFRAESTRUCTURA URBANA, REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2018-10-25	2018-12-31	600,460.84	600,460.84	0.00	600,460.84	0.00	12.00	02 METRO CUADRO	12.00	1 PERSONA	1	120	100.00
25069/0037/401854	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA SERVICIO DE DESALJO DE AGUAS RESIDUALES, INTRODUCCION DE DRENAJE / ZARAGOZA 1* SECCION	CONTRATO	2018-10-25	2018-12-31	609,780.26	609,780.26	0.00	609,780.26	0.00	35.00	01 METRO LINEAL	35.00	2 COLONIA	1	120	100.00
25070/0038/401925	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, CUARTO DORMITORIO, MURO FIRME, PISO FIRME, VARIAS CALLES, VARIAS COLONIAS / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2018-10-25	2018-12-31	2,753,850.60	2,753,850.60	0.00	2,753,850.60	0.00	16.00	02 METRO CUADRO	16.00	2 COLONIA	1	700	100.00
25162/0039/150600	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMTARIOS	196 PAVIMENTACION	Financiamiento Bónobras del ejercicio 2016 - 2018 / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2018-02-22	2018-12-31	13,229,060.04	13,229,060.04	0.00	13,229,060.04	0.00	50.00	01 METRO LINEAL	50.00	2 COLONIA	36	150	100.00
TOTAL										69,349,903.07	69,349,903.07	0.00	69,349,903.07	0.00	0.00					3799





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. AVANCE AL MES DE ENERO 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 70,170,837.00 REINTEGRO: \$ 820,933.93

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción	Obralocalidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Real
Complementarios: 9																			
Directa: 28																			


LIC. MANDO NAVARRO LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL



ING. DARIO MATA MATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



M. EN C. LUIS DAVID VELASQUEZ GUERRERO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

